


附表 3.2 交底记录表

技术质量 交底记录表

编号:

工程名称	巴淡岛能源动力项目及配套工程	交底人	李震
交底部位	主厂房深基坑	交底时间	
交底内容 (另附页提供交底影像资料):			
1.1、基坑概况及特点			
<p>主厂房 $\pm 0.00=12.80\text{m}$, 场地地坪标高为 -0.30m。总体思路基坑开挖采用二级放坡, 与东侧锅炉基坑 (-4.3m) 直接挖通。第一级从地坪标高整体开挖至 -4.30m 标高, 采用 $1:0.75$ 放坡, 预留 1.5m 工作面, 第二级坡为局部开挖从 -4.30m 至坑底 -4.5m、-5.0m、-5.7m、-6.4m、-7.1m (目前图纸未出), 采用 $1:0.5$ 放坡, 预留 1.5m 工作面。</p>			
1.2、基坑周边环境			
<p>基坑场地四周道路已修建完成, 基坑距北侧新建道路 56.5m; 距南侧新建道路 20m; 距离西侧锅炉基坑 (-4.3m) 8m, 鉴于两个基坑较近, 开挖深度相同, 采用主厂房基坑与锅炉基础挖通的方案; 距东侧新建道路 20m,</p>			
<p>基坑四周已修建道路; 现场基坑区域布置 2 台塔吊; 钢筋木工加工区设置 2 个; 现场布置 2 个一级配电箱, 详见下图:</p>			

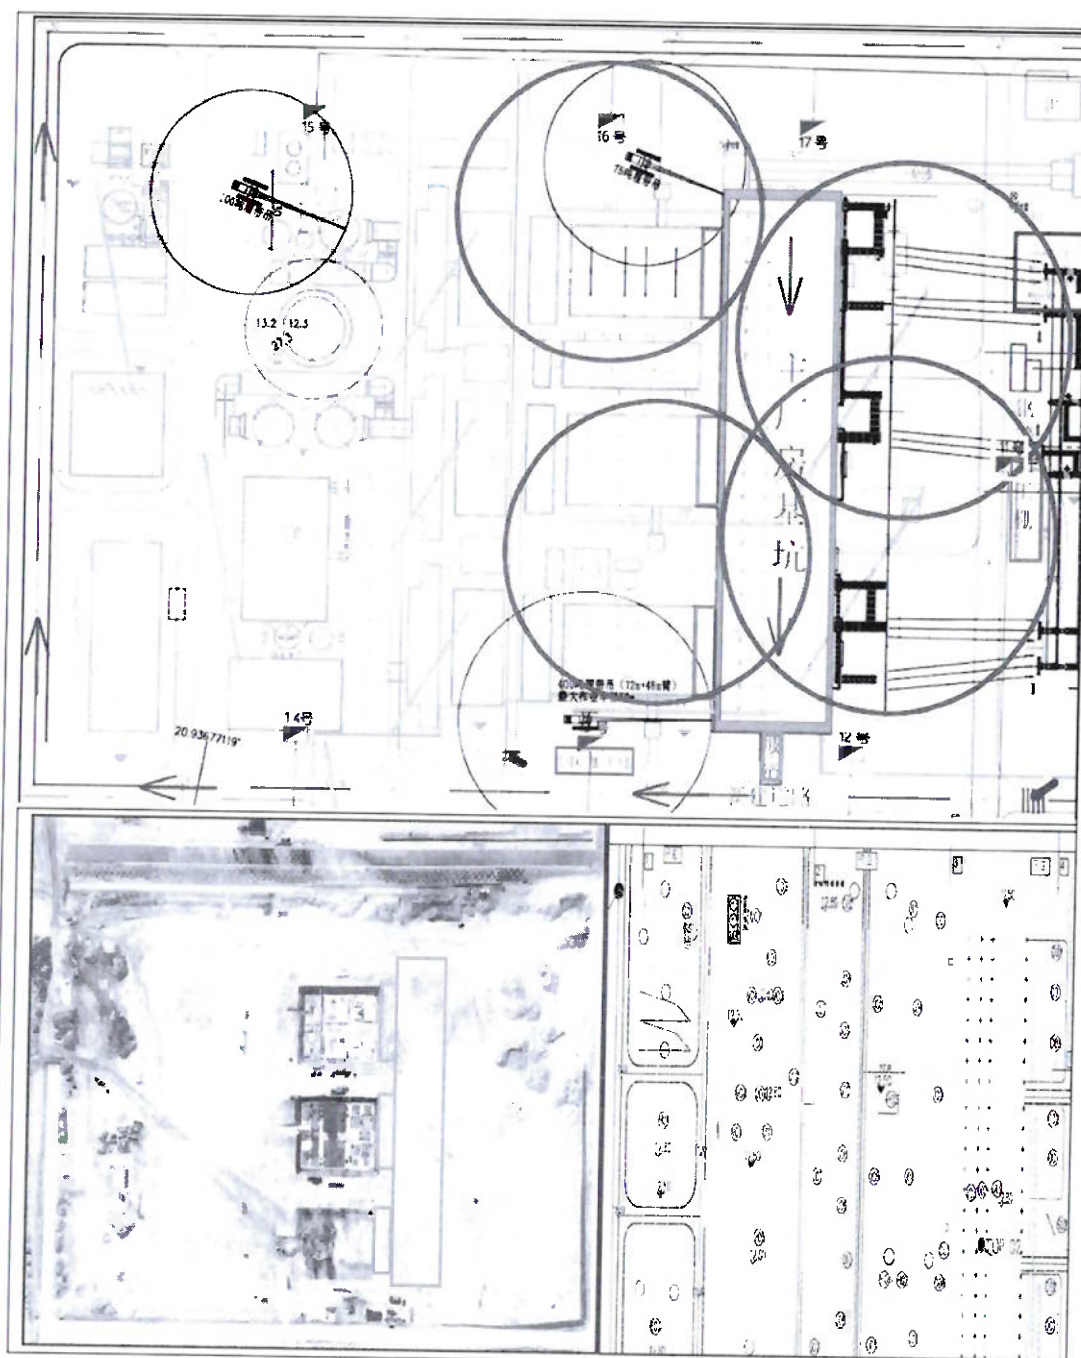

图一：场地周边环境现状示意图


1.3、基坑设计

1.3.1、基坑开挖设计

(1) A 轴-5.7m、1A-5A 轴-6.4m 基坑开挖


基坑开挖采用二级放坡，第一级坡从地坪标高-0.30m 开挖至至-4.30m

标高,采用 1:0.75 放坡,预留 1.5m 工作面,开挖后立即用防雨布对基坑一级开挖四周进行覆盖,第二级坡从-4.3m 依次开挖至-5.7m,采用 1:0.5 放坡,预留 1.5m 工作面,开挖后立即用防雨布对局部开挖基坑四周进行覆盖,如下图所示:

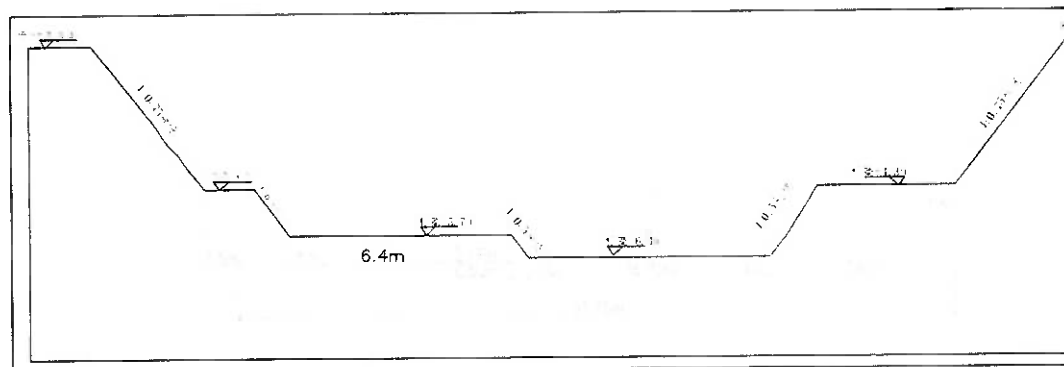

图二：基坑开挖示意图


第一次开挖基坑由南向北方向开挖,整体开挖至-4.3m,土方开挖及运输路线如图下所示,第二次开挖前修筑坡道。坡道宽 8m,坡道设置如图所示:

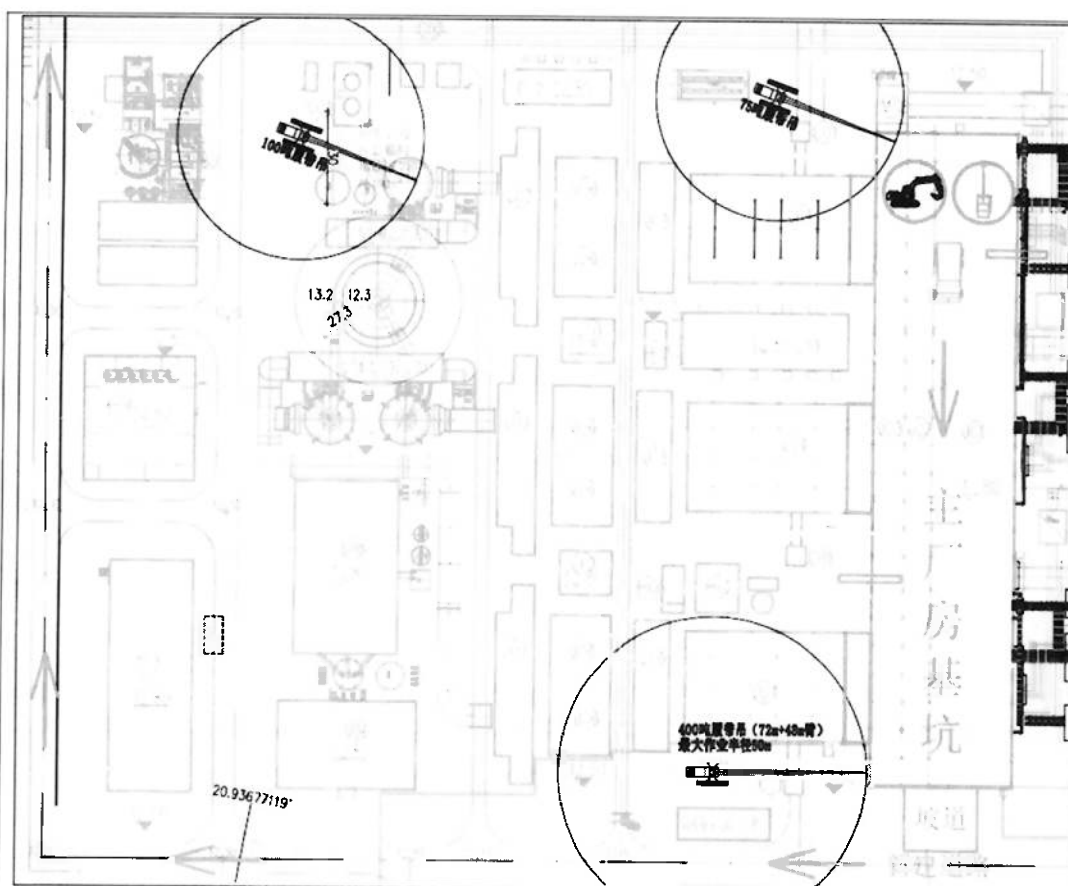

图三：土方开挖及运输路线示意图

1.3.2、基坑排水设计


基坑开挖深度为-4.3m至-7.1m，整体采用明沟与集水井排水。在基坑外侧1m设置150*150mm防水坎。基坑内侧1m处设置300*300mm排水沟，间隔50m设置1000*1000*1500mm集水井，排水沟尺寸：宽度300mm，深度300mm，坡度2%（坡向集水井）。集水井尺寸：1000×1000×1500mm（净尺寸），厚度240mm，内壁预留50mm抹灰层空间。如下图所示：

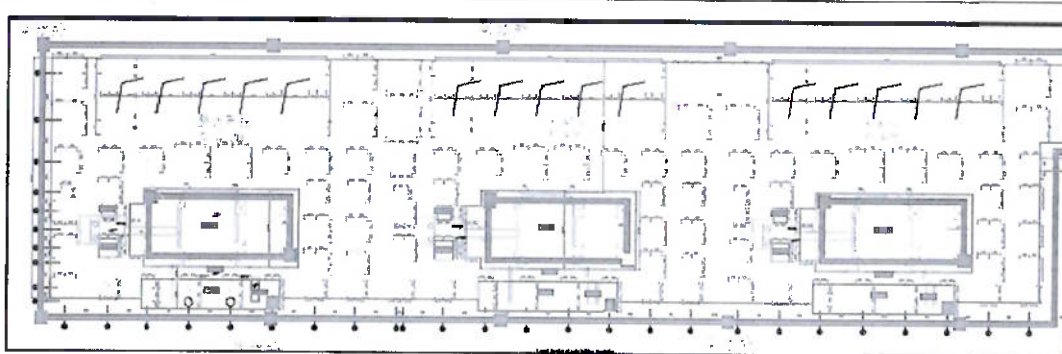

图三：基坑排水平面布置示意图

1.4、安全通道布置

基坑设置 5 处上下安全通道，安全通道采用钢管脚手架搭设，搭设宽度大于 1.2 米，两侧设置两道以上水平钢管（间距小于 500mm）作为栏杆，栏杆高度大于 1.2 米。如下图所示：

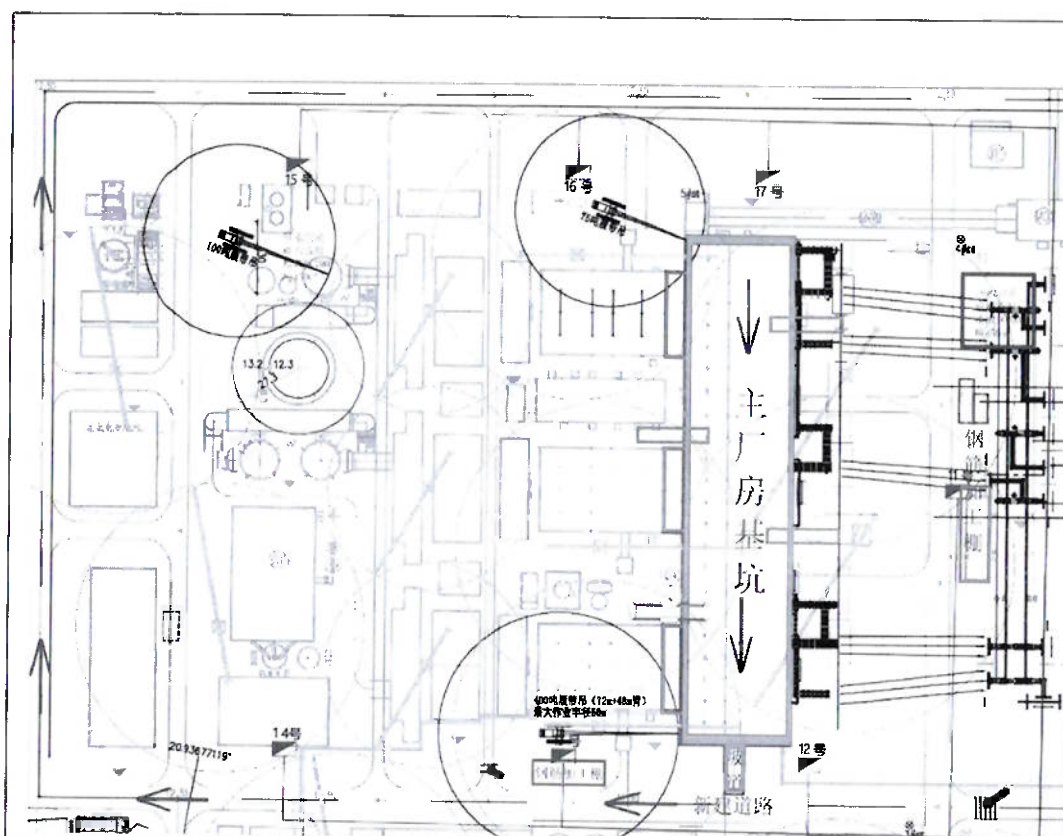

图五：基坑安全通道布置示意图

1.5、施工要求

1、工期目标

根据总进度计划，主厂房基坑计划于 2025 年 8 月 31 日开工，2026 年 3 月 8 日完成所有基坑回填作业。

2、质量目标

主体单位工程的质量等级达到优良，单位工程质量优良率>90%。

3、安全及职业健康目标

轻伤以上事故（含职业病）为零；

因施工设备、工程设备原因引起的安全事故为零；

火灾事故为零；

恶性交通安全责任事故为零；

重大治安保卫事件为零；

标准化工地达标率 100%。

杜绝发生同一种职业病因引起的职业病。

2、材料设备计划

1、主要设备投入计划

材料计划				
序号	名称	单位	数量	备注
1	挖掘机（配爆裂臂）	CAT500	1 台	
2	挖掘机	CAT200	2 台	基础开挖
3	自卸汽车	180 马力	10 台	土方运输
4	20 吨塔吊	ZSC400	2 台	
5	电焊机	ZXG-500	3 台	
6	平板夯	GX160	4 台	


3、施工工艺技术

3.1 施工总工艺流程

放线定位→开挖边坡放线→基坑边缘栏杆防护→坑外排水坎→基坑开挖→边坡防护→防护栏杆同步根据→坑内排水沟设置→地下结构施工→基坑分层回填至地面。


3.2 基坑开挖

基坑开挖采用二级放坡，土方开挖应严格遵守“分层、分段开挖，严禁超挖”的原则，并尽可能对称、均衡地进行土方开挖。第一级从地坪标高整体开挖至-4.30m 标高,开挖由 1 号锅炉向 3 号锅炉开挖,采用 2 台挖掘机同时开挖，1 挖掘机（配爆裂臂）配合，10 台自卸汽车土方外运，土方堆场距基坑约 500 米，如下图所示：

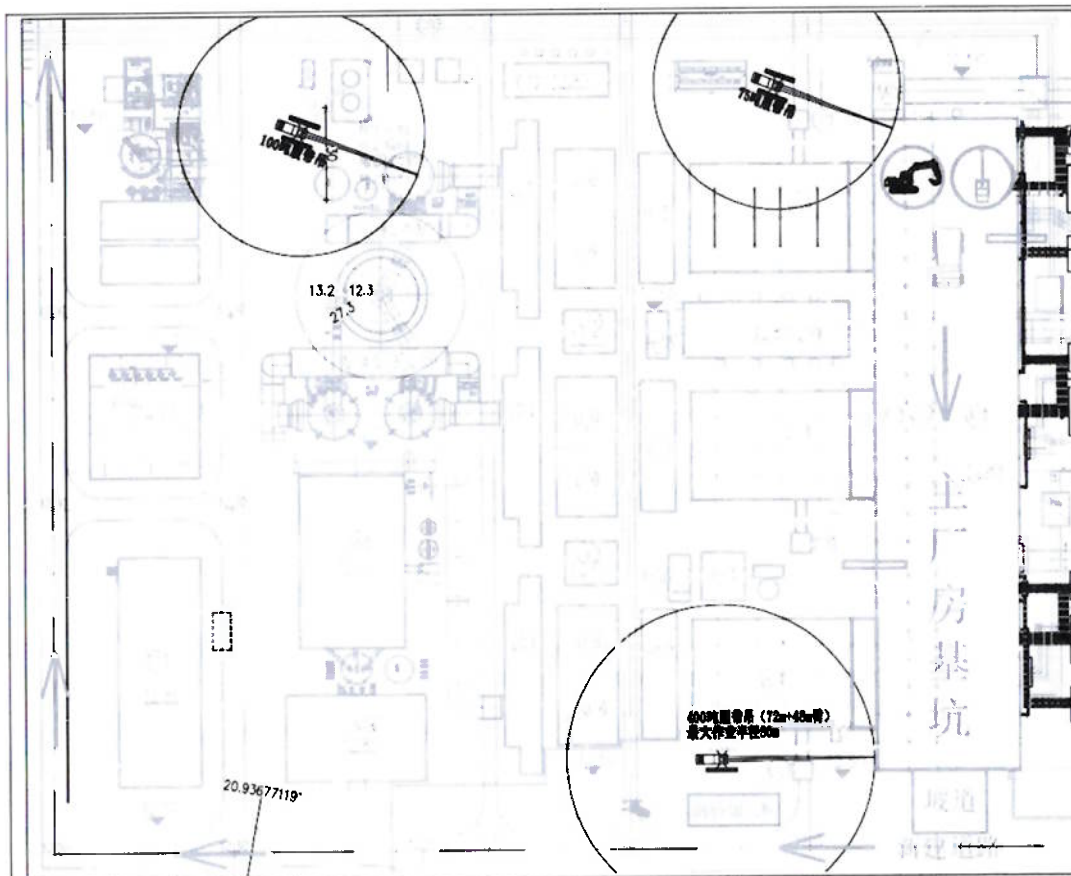

图六：土方外运示意图

第二级为局部开挖，局部开挖至坡底，开挖前修筑坡道。坡道宽 8m，后期作为人员上下通道。

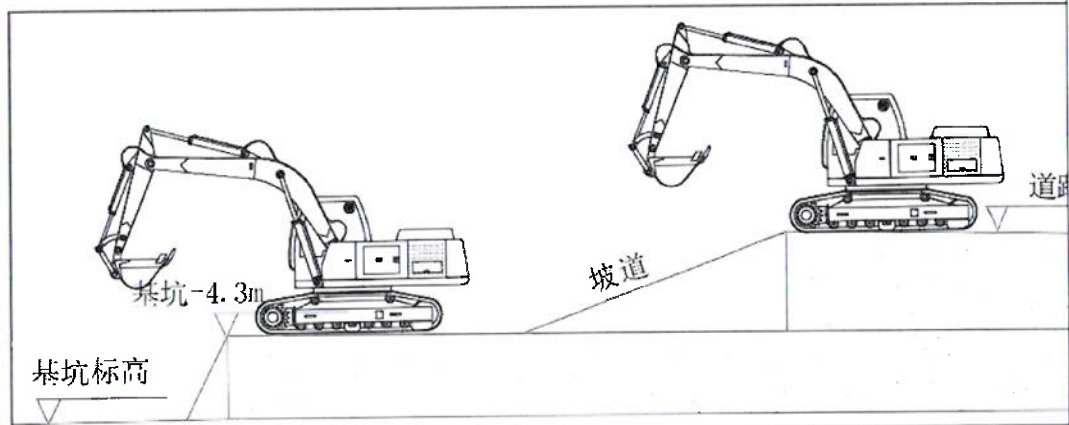


图七局部开挖示意图

4、施工安全保证措施

4.1 安全保证体系

本项目为保证项目正常实施，成立以项目经理为主的安全管理体系

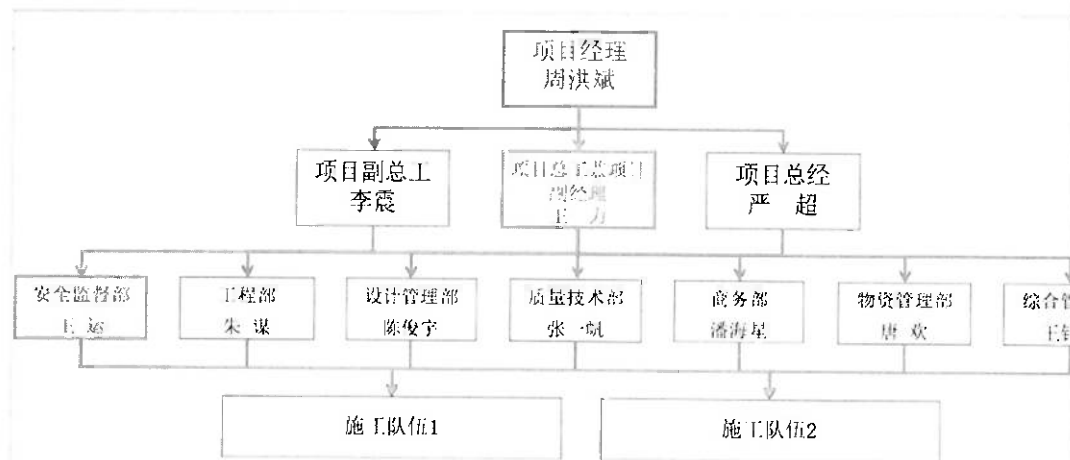

4.2. 质量技术保证措施

(1)、基坑支护及挖土顺序必须按照设计方案执行，开挖前需取得开挖令，每级放坡开挖前与支撑完成后开挖前必须进行验收，合格后下发开挖令。挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。

(2)、挖土时要注意边坡的稳定性，发现有裂缝及倾塌可能时，人员要立即离开并及时处理。人工挖土前后操作人员间距离不应小于2~3m，堆土要在1m以外，并且高度不得超过1.5m。机械挖土，启动前应检查离合器、制动器等，经空车试运转正常后再开始作业。

(3)、机械操作中进铲不应过深，提升不应过猛。

(4)、机械不得在输电线路下工作，在输电线路一侧工作，不论在任何情况下，机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求。

(5)、机械应停在坚实的地基上，如基础过差，应采取垫路板等加固措施，不得将挖土机履带与挖空的基坑距离2m内行驶停留。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶，防止坍方翻车。电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。

- (6)、配合挖土机的清坡、清底工人，不准在机械回转半径下工作。
- (7)、向汽车上卸土应在车子停稳定后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。
- (8)、场内道路应及时整修，确保车辆安全畅通，各种车辆应有专人负责指挥引导。
- (9)、车辆进出门口的人行道下，如有地下管线(道)必须铺设厚钢板，或浇筑混凝土加固。在开挖基坑时，必须设有确定实可行的排水措施，以免基坑积水，影响基坑的结构。基坑开挖前，必须摸清基坑下的管线排列和地质勘察资料，以利考虑开挖过程中的意外应急措施。
- (10)、沿基坑周边及二级平台周边设置钢管脚手架栏杆，立杆打入土内，并进行斜撑固定，适当布置上下基坑的梯笼，梯笼侧边设置护栏，严格控制坑边堆载。基坑分层开挖，减少边坡暴露时间。基坑顶部及底部均设置明沟排水，雨天需派人值班连续抽水，防止基坑水淹。
- (11) 基础回填土必须分层夯实,压实系数要求大于 0.95~0.97。基础回填土采用素土(土中有机杂质含量不超过 5%)。

5 基坑监测测量

基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点:应沿基坑周边布置，周边中部、阳角处应布置监测点。每边监测点数目不宜少于 3 个。水平和竖向位移监测点宜为共用点，监测点宜设置在坑坡顶上。

土体深层水平位移监测点:宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位。监测点水平间距宜为 20m~50m，每边监测点数目不应少于 1 个。

(3) 监测频率按下表确定

安全等级	施工进度		监测频率
二级	开挖深度	$\leq H/3$	1 次/3d
		$H/2 \sim H/3$	1 次/2d
		$2H/3 \sim H$	1 次/d
	底板浇筑 后时间 d	$\leq 7d$	1 次/2d
		7~14	1 次/3d
		14~28	1 次/7d
		> 28	1 次/10d

注：h—基坑开挖深度；H—基坑设计深度。

(4) 当出现下列情况之一时，应加强监测，提高监测频率，并及时向相关单位报告监测结果：

监测数据达到报警值；

监测数据变化量较大或速率加快；

存在勘察中未发现的不良地质条件；

基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏；

基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值；

周边地面出现突然较大沉降或严重开裂；

临近的建筑物出现突然较大沉降、不均匀沉降或严重开裂；

基坑底部、坡体或支护结构出现管涌、渗漏或流砂等现象；

基坑工程发生事故后重新组织施工；

出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

(5) 当出现下列情况之一是必须立即报警：

监测项目	二级基坑	
	累计值 (mm)	变化速率 (mm/d)
放坡坡顶水平位移	45	4
放坡坡顶竖向位移	35	3
深层水平	70	4
地表竖向	45	4

注：f2-构件承载能力设计值；fy-钢支撑设计值。

(6) 观测资料要及时整理出累计变形量及沉降速率等，并绘制沉降 (s) ~ 时间 (t) 关系曲线图、沉降 (s) ~ 时间 (t) ~ 距离 (H) 关系展开曲线图。

(7) 除了仪器测量外，还应每天派专人对基坑内部和周边环境进行巡视、检查，发现异常情况应及时上报。基坑周边堆载、边坡、渗漏、人员等巡查，具体如下表所示：

序号	监测对象	监测项目及内容	监测方法及频率
1	基坑	基坑渗漏水	施工员、安全员每天检查
2	边坡	基坑边坡变形监测	测量员每日监测 第三方监测机构每日监测
3	周边环境 施工材料	基坑周边超载状况，堆放有无不当之处	施工员、安全员检查每批次材料贮存情况
4	基地施工	土方开挖对工程桩	施工员、安全员在每个分项开工前预检
5	周边环境	地面裂缝	施工员、安全员每天检查
6	施工环境	有无临边临建状况；有无塌孔、积水；有无交叉作业	施工员、安全员在每个分项开工前预检
7	施工人员	有无持证上岗；有无佩戴防护用品；有无规范操作	施工员、安全员每天巡查
8	施工机械	有无带病作业；运行、停靠有无违规之处；有无跨行作业	施工员、安全员、机械员检查 每车次
9	施工工艺	新技术、新工艺有无不当之处；施工工艺是否规范	施工员、技术员旁站检查每道工序

现场巡视频率：基坑开挖后至基坑开挖完成稳定前 2 次/天；基坑开挖完

成稳定后至结构底板完成前 1 次/天；特殊情况时应加密巡视频率。日常巡视过程中，对现场施工中发生的异常状况要及时通报，做好记录并对现场状况进行影像资料存档、备查。

(8) 针对浅层滑坡、局部坍塌边坡清除边坡表面的松散土体、浮渣及杂物，避免二次坍塌。对于黏性土边坡，可掺入水泥、石灰等固化剂，提高表层抗剪强度；按照设计坡率重新修整边坡，确保坡面平整，坡度符合稳定性要求。对修整后的坡面采用机械压实（如小型压路机、平板振动器）或人工夯实，增强表层土体密实度。

6、验收标准

土方开挖工程质量检验标准 (mm)

项目	序号	项 目	允许偏差或允许值					检验方法
			柱基、基 坑、机槽	挖方场地平 整		管 沟	地 (路) 面基 层	
				人 工	机 械			
主控项目	1	标 高	-50	± 30	± 50	-50	-50	水准仪
	2	长度、宽度（由 设计中心线向两 边量）	+200 -50	+30 0 -10 0	+500 -150	+10 0	—	经纬仪, 用钢 尺量
	3	边 坡	设计要求					观察或用坡 度尺检查
一般项目	1	表面平整度	20	20	50	20	20	用2m靠尺和 楔型塞尺检 查
	2	基底土性	设计要求					观察或土样 分析

注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层。

7、应急处理措施

本工程建立以项目经理周洪斌为第一责任人、安全经理王运为直接管理

责任人、各参建施工单位为具体实施的施工安全管理体系。在项目上成立安全工作领导小组，项目经理周洪斌担任小组长，项目安全经理、项目施工经理、项目总工程师任副组长，安全管理部专职安全员及各参建施工单位专职安全员任组员。各参建单位建立相应的安全施工管理体系，从而形成整个工程项目施工的安全管理体系：

组长：周洪斌 082321982020

副组长：王力 082321982156；王运 081274158819；

组员：周红辉 085355801535；朱谋 082321982021；张一帆 085282296626；王钊庆 085282296627；唐欢 082321982160。

接受交底人员签字：

张杨 周红辉
王力 王运
于生 朱谋

年 月 日

备注：本表适用于各类交底记录，可附页。
